

STRI

| Télécoms & Réseaux |

Projet Sécurité

Compte Rendu DEFENSE

Audureau Nicolas
Begue Mathieu
Demblans Mathieu
Gidel Charles-Henri
Goffard Alexandre
Guillot Benjamin
Noiret Cathy

Sommaire

▶ Gestion du projet

Gestion des équipes

Gestion des étapes

Gestion du planning

▶ Description des étapes

Etape

Problèmes lors de l'étape

▶ Recommandations et Bilan

Sommaire

▶ Gestion du projet

Gestion des équipes

Gestion des étapes

Gestion du planning

▶ Description des étapes

Etape

Problèmes lors de l'étape

▶ Recommandations et Bilan

Gestion en équipes

Brainstorming

Veille Technologique

Installation

Exploitation

Coordination

Gestion en étapes

Etapes majeures

- ◀ Etape 1 : Mise en place de la maquette de base
- ◀ Etape 2 : Mise en place des VLANs
- ◀ Etape 3 : Mise en place du FireWall

Etapes mineures

- ◀ Mise en place de l'Antivirus
- ◀ Mises à jour
- ◀ Préconisations de sécurité

Gestion du planning

	A priori	A posteriori
Semaine 1 <i>11 oct → 15 oct</i>	Mise en place de l'étape 1	Mise en place de l'étape 1
Semaine 2 <i>18 oct → 22 oct</i>	Mise en place de l'étape 2	Synchronisation des groupes et des Accès distants
Semaine 3 <i>25 oct → 29 oct</i>	Mise en place de l'étape 3	Mise en place de l'étape 2
Semaine 4 <i>01 nov → 05 nov</i>	Pas cours (semaine tampon)	Mise en place de l'étape 3 (4 Nov)
Semaine 5 <i>08 nov → 12 nov</i>	Prise en compte des conseils finaux de l'équipe observation	Préparation du rapport écrit
Semaine 6 <i>15 nov → 19 nov</i>	Bilan au sein de l'équipe et préparation finale du rapport	Bilan au sein de l'équipe et préparation du rapport oral

Gestion du planning

	A priori	A posteriori
Semaine 1 <i>11 oct → 15 oct</i>	Mise en place de l'étape 1	Mise en place de l'étape 1
Semaine 2 <i>18 oct → 22 oct</i>	Mise en place de l'étape 2	Synchronisation des groupes et des Accès distants
Semaine 3 <i>25 oct → 29 oct</i>	Mise en place de l'étape 3	Mise en place de l'étape 2
Semaine 4 <i>01 nov → 05 nov</i>	Pas cours (semaine tampon)	Mise en place de l'étape 3 (4 Nov)
Semaine 5 <i>08 nov → 12 nov</i>	Prise en compte des conseils finaux de l'équipe observation	Préparation du rapport écrit
Semaine 6 <i>15 nov → 19 nov</i>	Bilan au sein de l'équipe et préparation finale du rapport	Bilan au sein de l'équipe et préparation du rapport oral

Sommaire

▶ Gestion du projet

Gestion des équipes

Gestion des étapes

Gestion du planning


▶ Description des étapes

Étape

Problèmes lors de l'étape

▶ Recommandations et Bilan

Etape 1

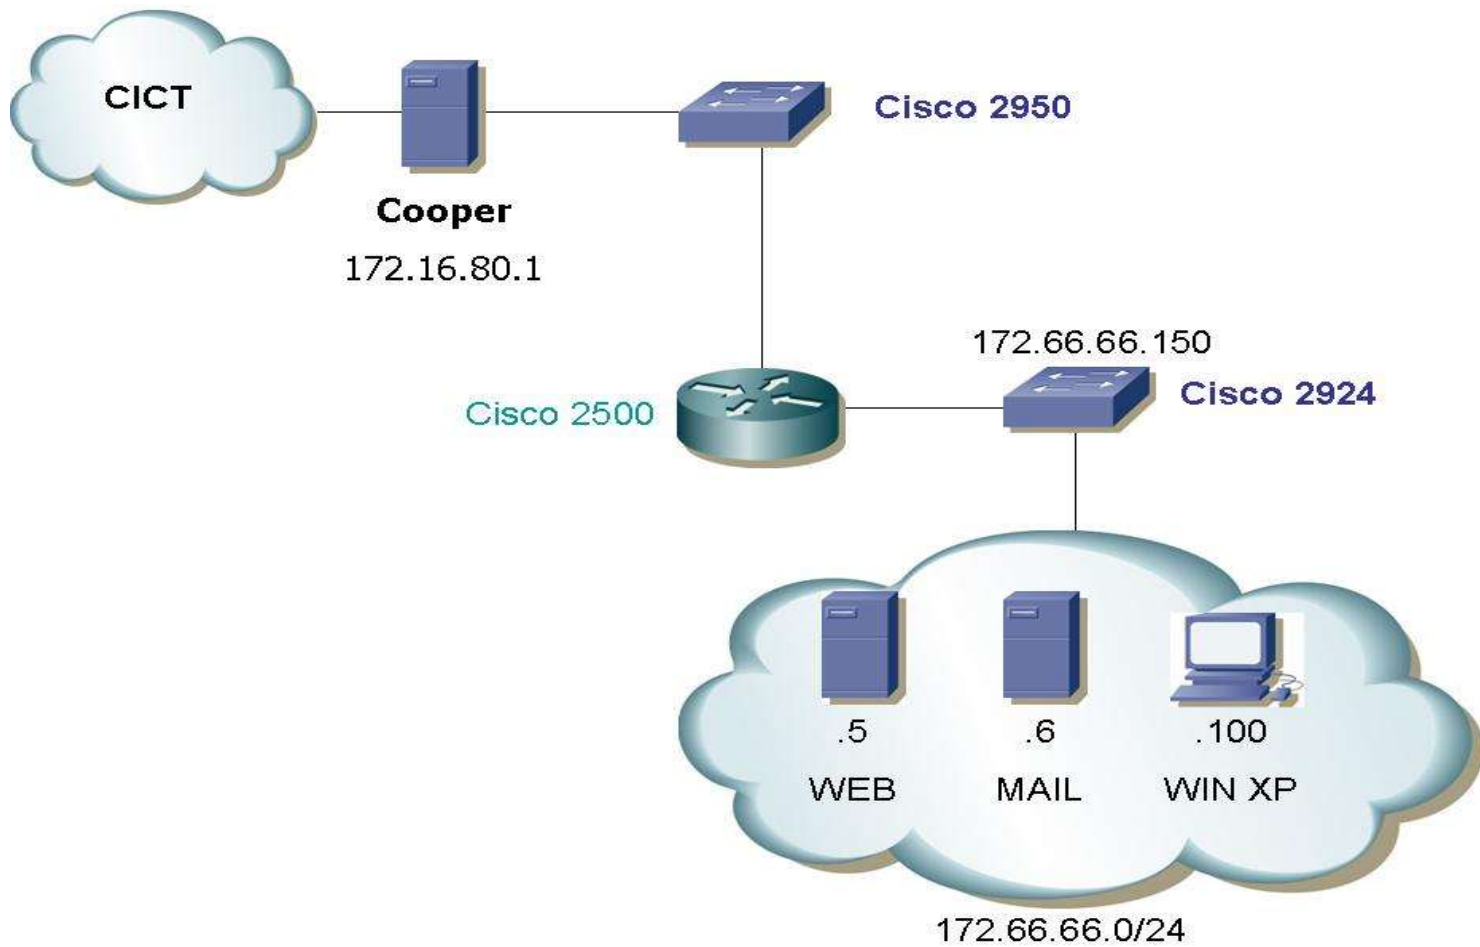

Problèmes lors de l'étape 1


Délai de mise en place

- ◀ Technique
- ◀ Organisation

Accès distants

RIP

Etape 2

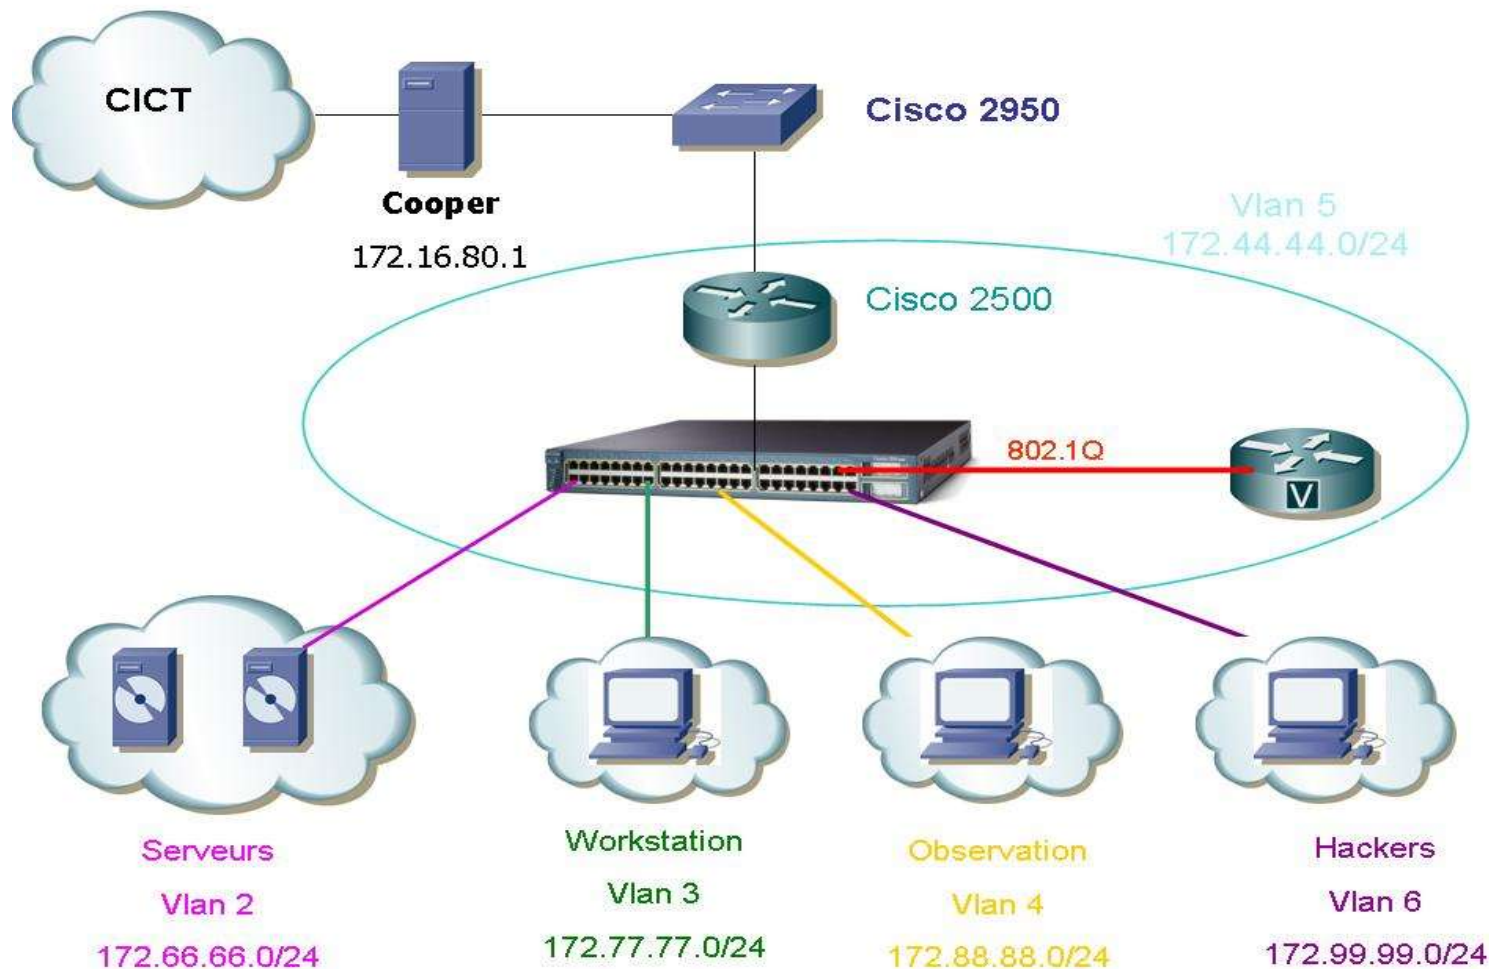

Problèmes lors de l'étape 2

Mise en place retardée


- ◀ Délai étape 1
- ◀ Meilleure synchronisation inter-groupe

Mots de passe

Port mirroring

VLAN DATABASE (VTP)

Etape 3

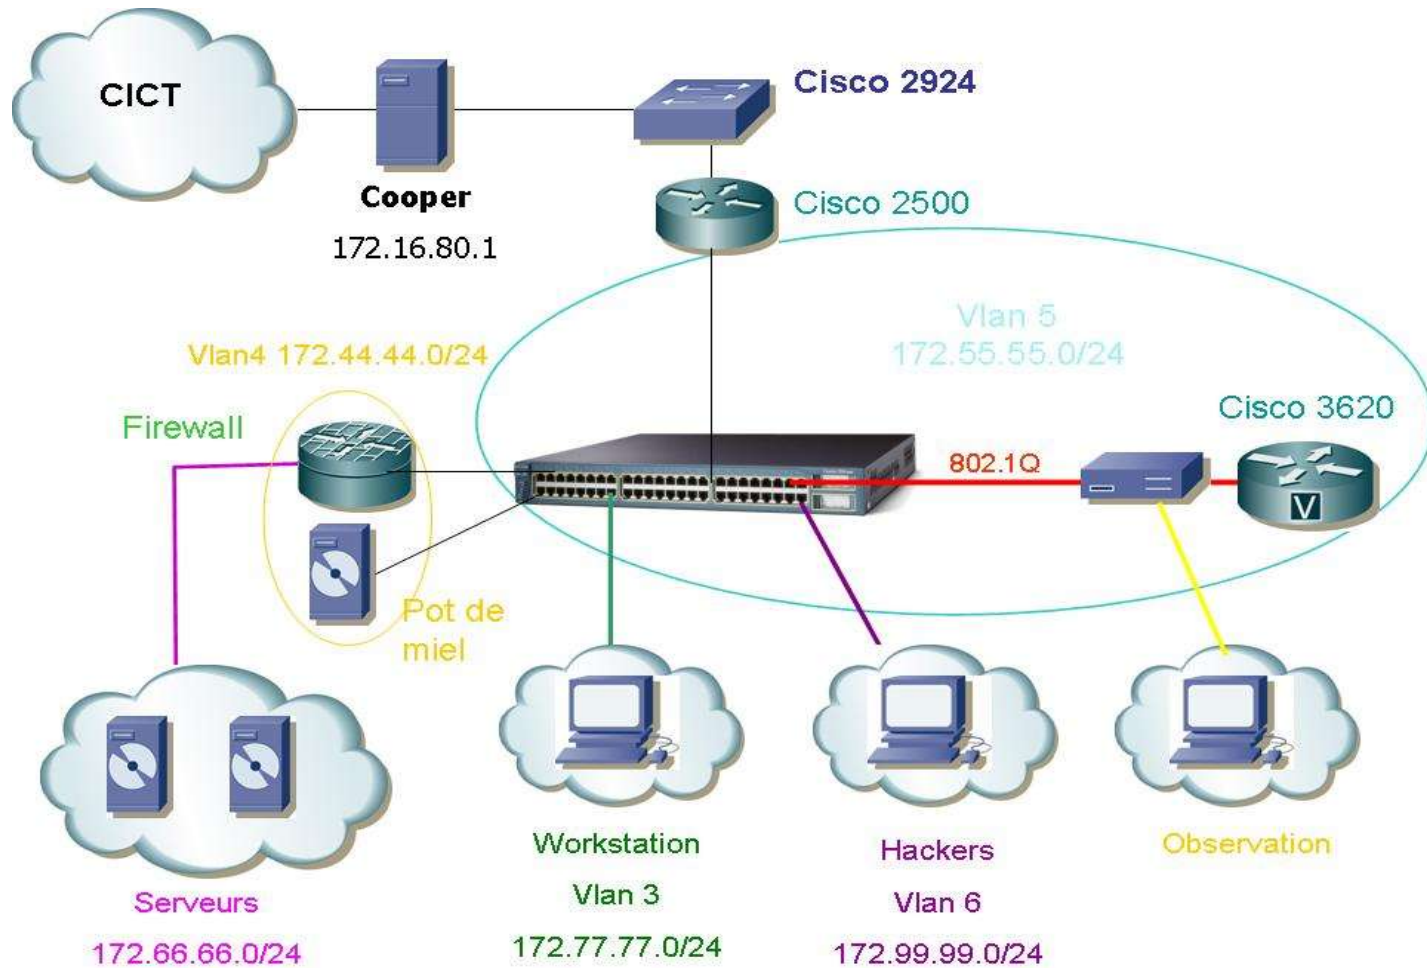

Problèmes lors de l'étape 3

Mise en place du Firewall délicate

- ◀ Accès distant
- ◀ Non maîtrise des flux

Active Directory

Quelques problèmes d'exploitation

Sommaire

▶ Gestion du projet

Gestion des équipes

Gestion des étapes

Gestion du planning

▶ Description des étapes

Etape

Problèmes lors de l'étape

▶ Recommandations et Bilan

Recommandations et Bilan

Plus d'encadrement

**Faire une synchronisation inter-groupe à
chaque séance**

Favoriser le travail inter-groupe

2 étapes suffisent

Très bon projet

Merci de votre attention

Questions ?
